

**SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**

**RESPOSTA À EXPEDIENTE DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE GUARIBA**

**Guariba, 16 de Outubro de 2.018.**

**Ao  
Exmo. Sr.  
Dr. Francisco Dias Mançano Júnior  
Prefeito Municipal  
Guariba- SP**

**Assunto: Câmara Municipal de Guariba.**

**Referente: Resposta ao requerimento 0024/18**

**Prezado Prefeito,**

Ao expediente em referência, solicito, para que dê conhecimento aos Senhores Vereadores que, temos a informar que a licitação dessa unidade ocorreu em 2017 com a empresa vencedora Julio César Leme Construtora EPP com o custo inicial R\$756.737,54 dando inicio aos trabalhos em 24/08/2017, sendo empenhado inicialmente R\$300.090,89 que correspondia a parte da obra, pois a reforma teve que ser feita em partes, devido a mesma não parar os trabalhos desta unidade, sendo executado nesta primeira parte (ano 2017) a construção do novo bloco de cozinha e refeitório e reforma geral do bloco anexo a esta ampliação, serviços estes que a empresa desenvolveu no prazo estipulado por esta secretaria, no dia 31/10/2017 esta secretaria por meio do secretario municipal solicitou ao departamento de licitação o empenho do restante da obra o valor de R\$456.646,45, empenho este que nos foi encaminhado no dia 05/01/2018 data esta que a empresa iniciou os trabalhos da segunda etapa correspondente a reforma geral dos blocos de sala de aula e administrativo. Serviços estes que foram desenvolvidos pela empresa até o final de abril/2018 ficando para o termino dos trabalhos toda a troca da rede elétrica e os serviços extras solicitados pela Secretaria da Educação tais como: troca de todo o concreto da área de circulação com o total de aproximadamente de 800 metros quadrados de piso e assentamento de pastilha em todo o pátio coberto e diversos outros serviços constantes na planilha de aditamento. Concomitante ao processo de reforma da escola EMEB Prof. Luiz Garavello foi feito um processo de licitação para instalação de um Posto de Transformação de 150Kva para suprir a nova rede de energia licitada na reforma da referida unidade. Serviços este que


foi desenvolvido pela empresa vencedora e entregue a esta secretaria no mês de maio de 2018.

A empresa Julio Cesar Leme Construtora EPP deu continuidade nos serviços sendo a execução da rede elétrica interna do prédio e os demais serviços estipulados por esta secretaria, ficando no aguardo para a execução da entrada principal da escola após a instalação do posto de transformação pela Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL serviços estes executados no início do mês de outubro de 2018.

Portanto permitindo que a empresa finalize os trabalhos, data prevista para o término da obra no início de dezembro/2018.

É o que temos até o presente momento a apresentar.

Cordialmente.

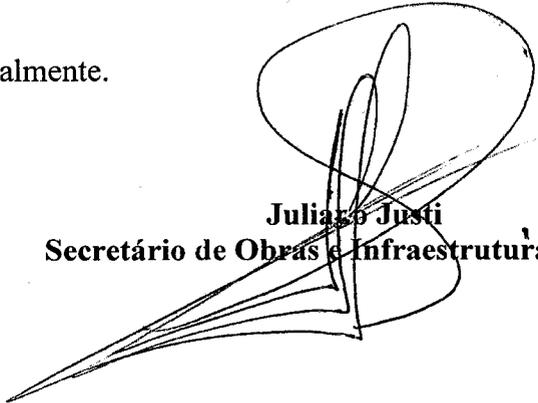

**Juliano Justi**  
**Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana**
